

RuTube Influencer Platform

Платформа-маркетплейс для связи рекламодателей и блогеров на RuTube. Прогноз на 36 месяцев на основе открытых данных рынка 2024–2026.

БЮДЖЕТ ПИЛОТА

2,5 млн ₽

СРОК ПИЛОТА

4 месяца

СТАРТ ПРОЕКТА

1 июня 2026

ОКУПАЕМОСТЬ

~14 месяцев

NPV (3 ГОДА, R=20%)

~38 млн ₽

Маркетплейс для интеграций на RuTube

СУТЬ ПРОДУКТА

Двусторонняя цифровая платформа, агрегирующая **спрос рекламодателей** (бренды малого и среднего бизнеса) и **предложение инфлюенсеров** на RuTube. Платформа ищет блогеров под нишу бренда, управляет кампанией, обеспечивает прозрачную атрибуцию продаж через UTM и промокоды и проводит расчёты со сторонами. Монетизация — **20% комиссии** с каждой сделки.

СЕГМЕНТ И НИША

Целевой сегмент — **микро- и средние блогеры RuTube** (10К–500К подписчиков). Это ~70% объёма рынка, но самая фрагментированная часть, где у брендов нет инструментов прямого подбора. Целевые рекламодатели — e-commerce и FMCG, для которых важна прозрачная атрибуция продаж, а не охватные метрики.

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

Платит 18 000 ₽

ПЛАТФОРМА

Удерживает 3 000 ₽ (20%)

ИНФЛЮЕНСЕР


Получает 15 000 ₽

Окно возможностей 2026–2027

Логика: Instagram заблокирован для рекламы с 01.09.2025 (–11,6 млрд ₽ перетекают). RuTube — самая быстрорастущая видео-платформа РФ (+117% мобильных MAU за полугодие). Инструмент для прямой связи брендов с микро-блогерами на RuTube ещё **не сформировался** — конкуренты (Getblogger, Epicstars) сидят на YouTube/Telegram.

85 млн MAU RuTube, декабрь 2025 Прогноз 2026: ~102 млн (+20%)	+128% Рост рекламы у блогеров RuTube 2024→2025 Кокос: 250M → 570M ₽	~1 ₽ CPV — самый дешёвый среди видео YouTube — 2,5 ₽; Telegram — 4,1 ₽	+170% План «Газпром-медиа» 2026 2,2 → 6 млрд ₽ (Жаров)
--	--	---	---

Денежный поток и точки разворота

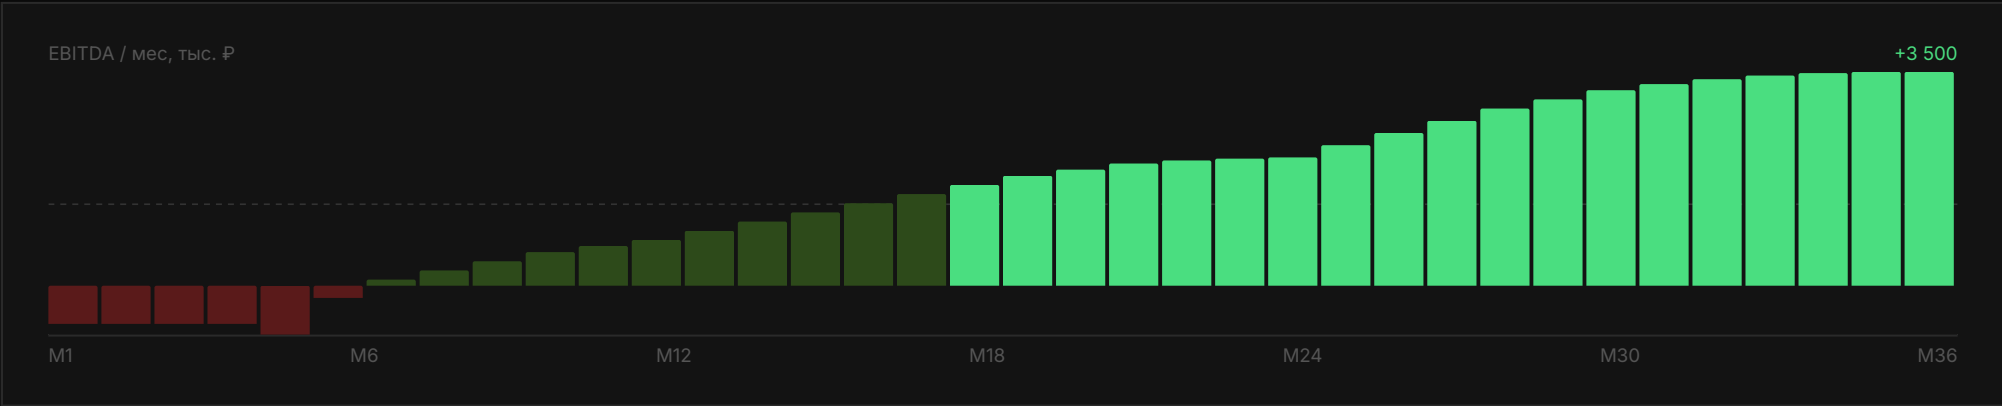

МЕС 6-7

Break-even

EBITDA выходит в плюс при ~126 интеграций/мес

МЕС 14

Окупаемость

Накопленная EBITDA покрывает MVP + убытки

МЕС 24

~24 млн ₽

Накопленная NPV

МЕС 36

~38 млн ₽

NPV (ставка 20% годовых)

Инвестиционная привлекательность

ИНВЕСТИЦИИ — ПИЛОТ 2,5 млн ₽ 4 месяца на проверку гипотез	ИНВЕСТИЦИИ — ДО ОКУПАЕМОСТИ 12 млн ₽ Пилот + MVP + операц. убытки	СРОК ОКУПАЕМОСТИ 14 мес С момента старта пилота
NPV — 36 МЕСЯЦЕВ ~38 млн ₽ Ставка 20% годовых	IRR ~95% На горизонте 3 лет	ROI ГОДОВЫХ (ПОСЛЕ M14) ~280% EBITDA год / инвестиции

EBITDA НА КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ

12 МЕС	+750 К ₽/мес	24 МЕС	+2,1 млн ₽/мес	36 МЕС	+3,5 млн ₽/мес
--------	--------------	--------	----------------	--------	----------------

Проверка трёх гипотез за 4 месяца

Цель пилота — за **8–10 недель** и **~2,5 млн ₽** получить статистически достоверный ответ: **сходится ли модель в горизонте года или нет.**

ЗАЧЕМ ИМЕННО ЭТИ ТРИ

Conv лид→бренд → есть ли спрос?	Outbound 50 брендов
ROMI бренда → работает ли юнит-экономика?	10 интеграций
Repeat Rate → есть ли LTV?	Замер на 60-й день

Дешёвая страховка от неработающей экономики — ~21% от полной разработки MVP

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ

Conv лид → платящий бренд	≥ 30%
ROMI пилота для рекламодателя	≥ 50%
Repeat Rate за 60 дней	≥ 50%

ЦЕНА ОТВЕТА

Бюджет пилота	2,5 млн ₽
% от полного бюджета MVP	~21%
Срок до решения Go/No-Go	4 месяца

Решение → следующий слайд

Что делаем при каждом сигнале

СИГНАЛ	ИДЁМ	ДОРАБАТЫВАЕМ	СТОП
Conv лид → пилот	≥ 30% Outbound работает, ниша адекватная	15–30% Спрос есть, упаковка слабая	< 15% Нет рынка / нет ценности
ROMI пилота (бренд)	≥ 50% Юнит-экономика сходится	20–50% Сужать вертикаль, искать категории с лучшим CR	< 20% Базовая интеграция убыточна — масштаб не поможет
Repeat Rate за 60 дней	≥ 50% LTV закрывает САС, можно лить в рост	30–50% Маржа сходится, но единичные клиенты не вытянут масштаб	< 30% Нет повторов → нет LTV → модель не сойдётся

Правило: хотя бы один «Стоп» — приостанавливаем до пересмотра ниши/оффера. Все три «Идём» — переходим к MVP.

Бюджет пилота: 2,5 млн ₽ · 4 мес

План работ с 1 июня 2026

ЭПИК	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ
E1. Инфраструктура трекинга UTM, промокоды, дашборд атрибуции, CRM	3 нед	1 нед		
E2. Outbound к 50 брендам Скрипты, холодные письма, демо-звонки	2 нед	4 нед		
E3. Подключение блогеров RuTube База 30 блогеров, отбор 10 для пилота		3 нед	1 нед	
E4. Запуск 10 пилотных интеграций Бриффы, продакшн, размещение			3 нед	
E5. Замер ROMI и Conv Сбор первичной аналитики продаж			тест	сбор
E6. Замер Repeat Rate за 60 дней Контроль возврата клиентов				2 мес наблюдения
E7. Решение Go / Fix / Stop Сверка с матрицей, отчёт стейкхолдерам				★ checkpoint

Куда уходят 2,5 млн ₽

СТАТЬЯ	РАСЧЁТ	СУММА, ₽
ФОТ КОМАНДЫ (4 МЕС.)		
Руководитель проекта	200 000 × 4	800 000
Менеджер продаж (SDR)	120 000 × 3	360 000
Менеджер по блогерам	90 000 × 3	270 000
Аналитик (part-time)	80 000 × 4	320 000
Итого ФОТ		1 750 000
ЗАКУПКИ И ИНТЕГРАЦИИ		
10 интеграций (микро-сегмент)	15 000 × 10	150 000
Резерв на расширенные тесты	—	100 000
Outsourced задачи	дизайн брифов, А/В	80 000
Итого закупки		330 000
АРЕНДА ИНФРЫ И ИНСТРУМЕНТОВ		
CRM, рассылки, ATS	15 000 × 4	60 000
Аналитика, attribution	20 000 × 4	80 000
Хостинг, домен, чат-боты	—	40 000
Юр./бух. сопровождение	—	120 000
Резерв (~5%)	—	120 000
Итого инфра + резерв		420 000
ИТОГО БЮДЖЕТ ПИЛОТА		2 500 000

ИТОГО

2,5 млн ₽

ФОТ	70%
Закупки	13%
Инфра + резерв	17%

Срок 4 мес

Burn rate ~625 К ₽/мес

Что нужно от стейкхолдеров

БЮДЖЕТ ПИЛОТА

2 500 000 ₽

Единоразовое выделение на 4 месяца. Расход равномерный (~625 К ₽/мес).

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Назначить Project Lead

Загрузка 100%. Полномочия: бюджет, найм, операции. Отвечает за Go/Fix/Stop.

СТАРТ ПРОЕКТА

1 июня 2026

Окончание — 30 сентября. Решение по матрице — последняя неделя сентября.

К МОМЕНТУ 1 ИЮНЯ НУЖНО

- Подписать выделение бюджета 2 500 000 ₽ на пилот
- Назначить руководителя проекта с правом подписания договоров до 200 К ₽
- Согласовать список из 50 брендов-кандидатов для outbound (e-com, FMCG)
- Открыть юр. лицо или использовать существующее с возможностью договорной работы с самозанятыми
- Утвердить матрицу Go/Fix/Stop как обязательный чек-пойнт по итогам пилота
